

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 63.91.26/138
НА ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТА ЭНЕРГООБРУДОВАНИЯ (ЛИНИЙ СЕТЕЙ)**

Инвентарный (учетный) № 1243-30

Наименование: Сеть оповещения АО «ПО «Севмаш»

Характеристика: Сеть оповещения защитного сооружения №1243-30, участок цеха № 42.

№ п/п	Оборудование и его тип	Описание дефекта	Описание работ по устранению дефектов	Необходимый срок устранения	Необходимые материалы (марка, размер, количество) Необходимые запчасти (№ чертежа, комплекта)	Необходимая документация	Стоимость материала	Стоимость зап. частей	Разряд	Норма времени в н/ч		Стоимость работы в руб. по работам		Обоснование норм	Необходимые послеремонтные испытания (объем, программа, по ГОСТ или ТУ)	Отметка о выполнении работ
										Ручных	Станочных	Ручных	Станочных			
1	Морская полевка	Естественное старение кабеля. Несответствие электрических параметров кабеля требуемым величинам. Заниженное сопротивление изоляции проводов. Множественные повреждения линии.	Предусмотреть замену неисправного кабеля. 8 м проложить от существующего шкафа, расположенного на 1 этаже восточного крыла ЮСБК цеха № 42 по кабель-каналу до приемка № 1615. 108 м проложить по существующей кабельной канализации от приемка № 1615 до колодца № 462. Переходы кабеля через стены защитить металлической трубой 0,3 м.	5	Кабель МРМпз 2х1,2 – 116 м Хомут нейлоновый 3,6х150 – 1уп. Комплект маркировочный КМП – 1 уп. Труба металлическая d35мм – 0,3 м	№1). Дефектная ведомость № 63.91.26/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

И.о. начальника ОС ЭМУ

В.Н. Тихонов



Мастер отдела связи ЭМУ

Д.А. Котлов



Мастер отдела связи ЭМУ

А.Ю. Ипполитов



Начальник цеха №40

А.Н. Соколов



1 этаж,
ЮГОЗВОСТОЧНЫЙ
ВХОД

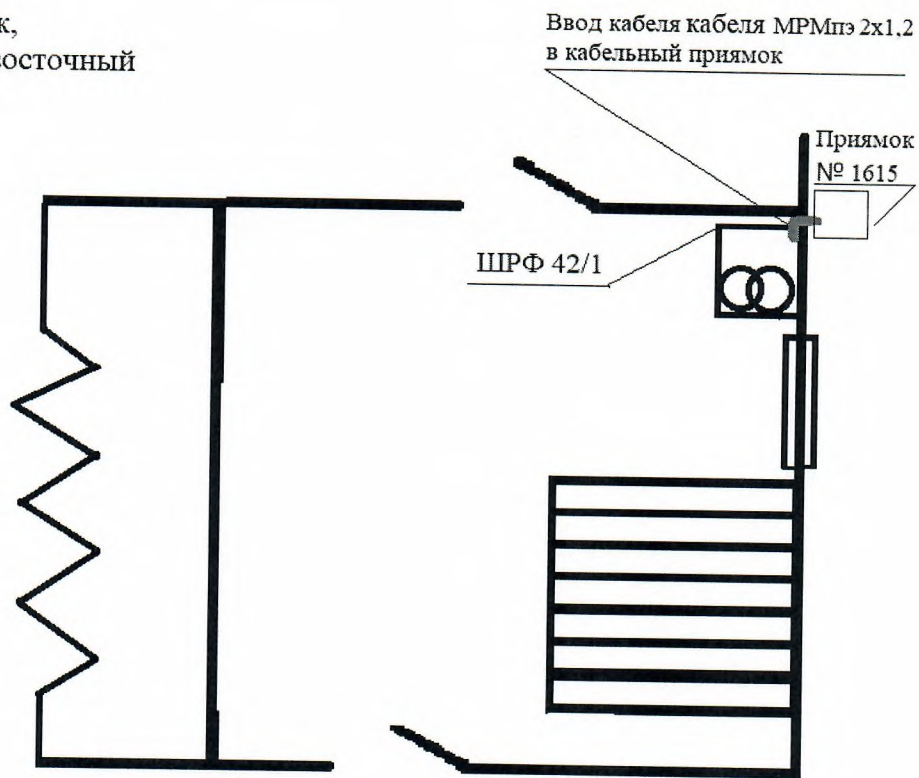


Схема прокладки кабеля МРМпэ 2х1,2
в кабельной канализации

